

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 8/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Vesikaton puutyöt
- Sähkötyöt
- Ullakon IV-asennukset ja eristykset
- 2.krs kevyet väliseinät
- Vesikaton pellitystyöt
- Talotekniikka reikien poraukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs betonin etuputsityöt
- 1.krs sementtiliimojen poistot
- Liikuntasalin ripustusrakenteet

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs kevyet väliseinät
- 1.krs väliseinäasennukset
- Vesikaton höyrynsulku
- Liikuntasalin teräsrakenteet
- Työmaan vesilinjan asennukset

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs väliseinäasennukset
- 3.krs IVKH lattiaraudoitukset
- Sähkötyöt
- Työmaan vesilinjan asennukset
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton höyrynsulku
- Talotekniikka reikien poraukset
- 1.krs pölynsidontamaalaus
- 2.krs pölynsidontamaalaus

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs kevyet väliseinät
- 2.krs pintalaattojen raudoitustyöt
- Aurinkopaneeliasennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs sementtiliimojen poistot

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Työmaan vesilinjan asennukset
- 1.krs alapohjan raudoitustyöt
- Säätösuojan asennukset
- 2.krs pintalaattojen raudoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- 2.krs pintalaatan valu (2/2)

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs alapohjan valu (1/2)
- 2.krs pintalaatan valu (1/2)
- Sisäpuolen maataytöt

Muuta

- Koulunmäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa

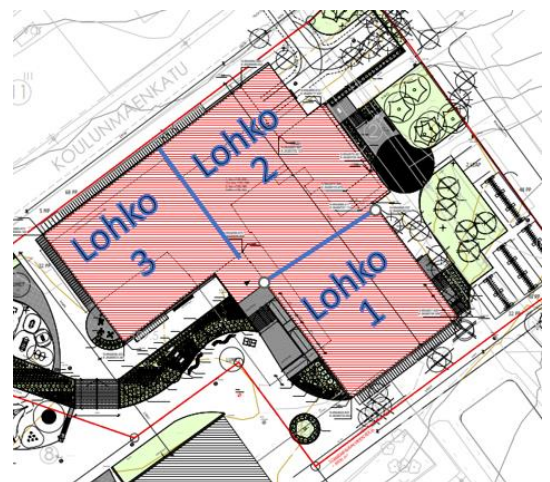

Lohko 3. 22.2.2024

Sääsuoja-asennukset ja 2.krs
pintabetonilaatan valut käynnissä.



Lohko 1. 22.2.2024

Liikuntasalin teräsrakenteiden
asennukset käynnissä.
Levyrakenteiden kiinnitys aloitettu.



Lohko 2-3. 22.2.2024

Höyrynsulun asennukset aloitettu.
IV-konehuoneen Paroc-
elementit asennettu.



Lohko 1. 22.2.2024

Vesikaton peltien,
kattoturvatotteiden, läpivientien
sekä vesikourujen ja -syöksyjen
asennukset miltein valmiit.

