

Painotalon saneeraus

Viikkotiedote

viikko 20

2.5-20.5.2022

Työmaan vahvuus 7

Työvaiheet: Vesikaton vedeneristystyöt jatkuu, seinälaatoitukset kosteat tilat jatkuu, maarakennustyöt aloitettu ja sääsuoja purettu. Alakattotyöt aloitettu 2 krs.




Alakattorungot 2 krs toimistoissa.




Tanssisalin katossa on uudet IV kanavat.



Rakennuksen ympäryskaivu aloitettu. Sokkelin vesieristys aloitettu. Salaoja putkea menee noin 260m ja salaojakaivuja 17 kpl sekä vesieristys huopaa 400m² eli 26 rullaa.

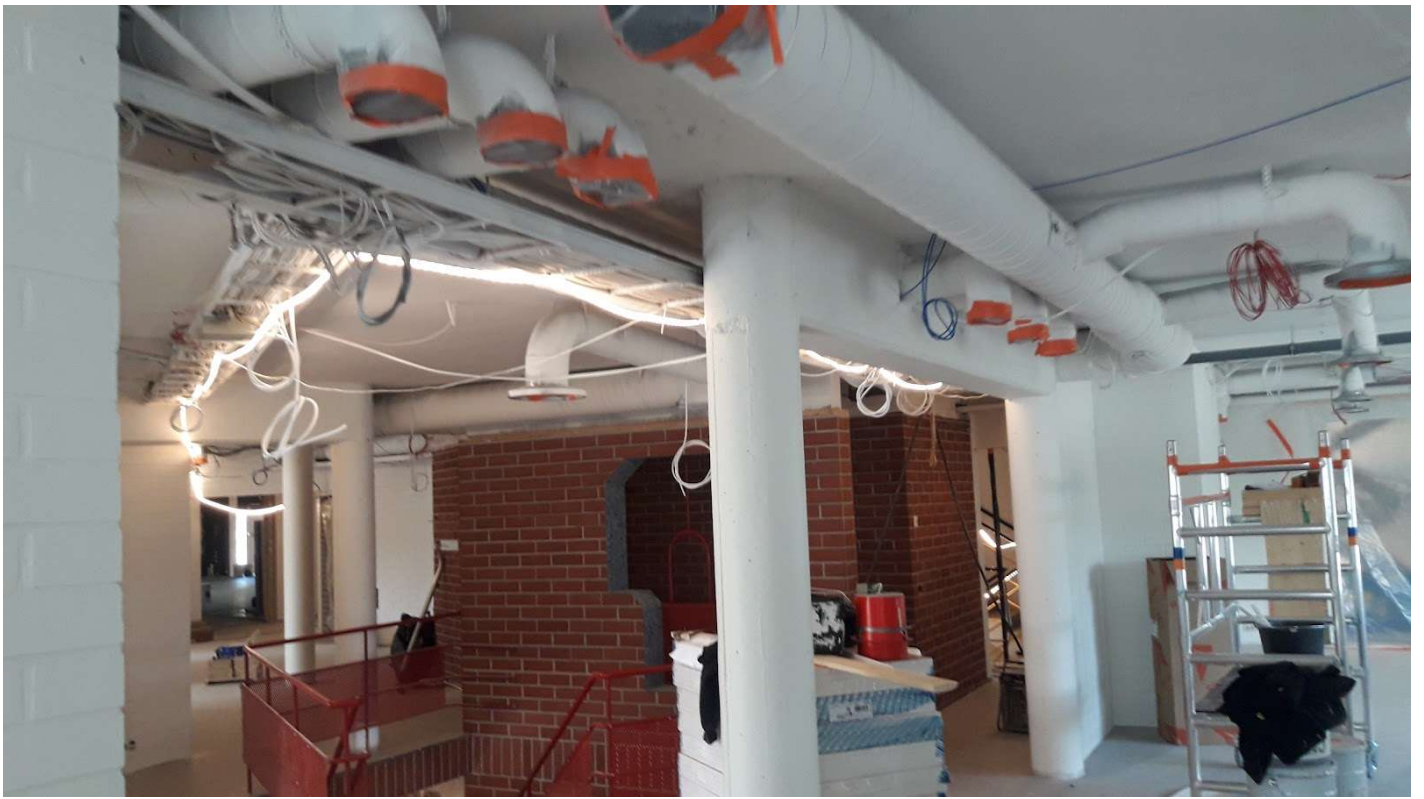

2 krs aula.

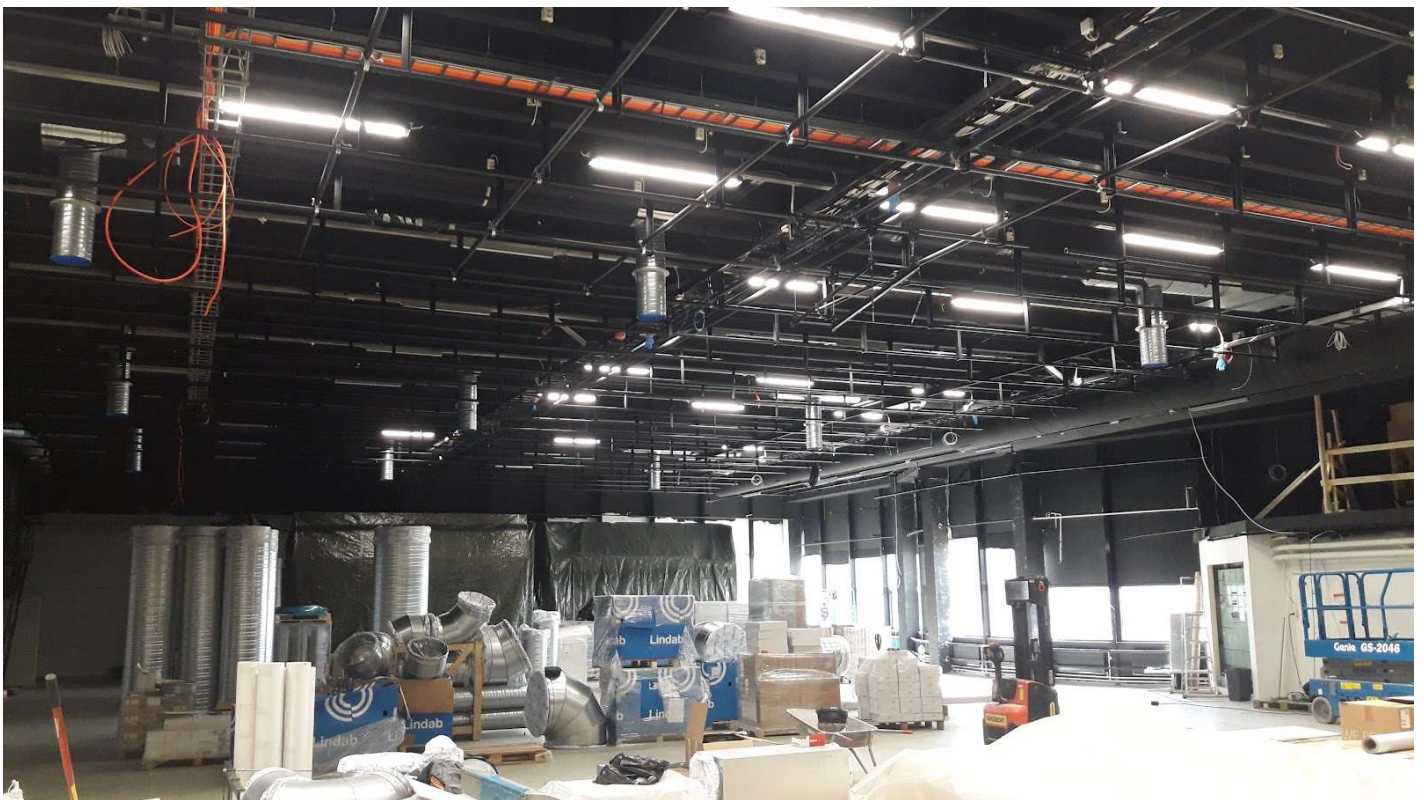

Isossa salissa on muutama uusi kanava.

Tulevia uusia työvaiheita. Lattialaatoitukset ja saunan rakentaminen.

 **PS-RAKENNUS OY**

Marko Konola
puh 040 6434141
