

17.5.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 20/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- 1.krs kevyet väliseinät (liikuntasali)
- 1.krs etuputsityöt (liikuntasali)
- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt
- 2.krs IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Sääsuojan purkaminen

Valmistuneet työvaiheet:

- Näyttämön teräsrungon asennus (liikuntasali)

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton peltityöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- Kattoikkunoiden asennus
- 1.krs musiikkitilojen IV-asennukset
- 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs plaanovalmistelut
- 2.krs plaanovalmistelut

Valmistuneet työvaiheet:

- Aulan korkean tilan kipsilevykatto
- Aulan lasiseinien teräsrungon asennus

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH koneasennukset
- IVKH IV-asennukset
- Nuorisotilan siirtoseinän teräsrungon asennus
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- Sääsuojan purkaminen
- 2.krs IV-asennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs plaanovalmistelut
- 2.krs plaanopumpatukset

Muuta

- Koulunmäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Julkisivun elementtisaumaus valmis
- Julkisivun puu- ja levytyöt käynnissä uimahallin puoleisella seinustalla
- Työmaalämmityksen purku viikolla 21

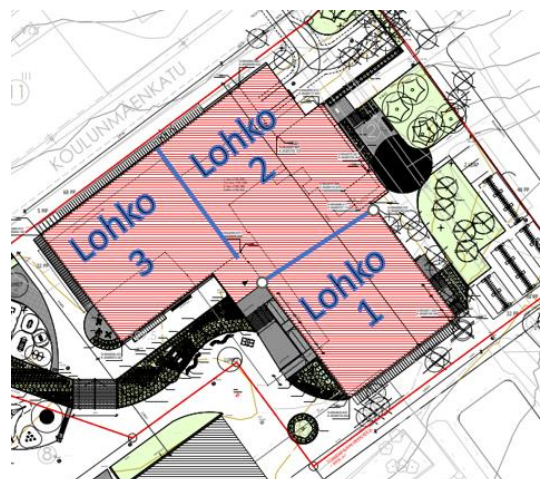

Lohko 2. 16.5.2024

Akustiikkavillat pääosin asennettu teknisiin tiloihin. Talotekniikan asennukset seuraavat perästä.



Lohko 2. 16.5.2024

Kerroksen 1. musiikkitilojen IV-
asennukset käynnissä. Lattian
plaano seuraa perästä.



Lohko 1. 16.5.2024

Väestönsuojassa aloitettu
vedeneristys- ja laatoitustyöt.



Lohko 2. 16.5.2024

Julkisivun puurakenteiden
koolauksien teko meneillään.
Elementtisaumat kitattu.

