

24.5.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 21/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Sääsuojan purkaminen
- 1.krs etuputsityöt (liikuntasali)
- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt
- 2.krs IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs plaanovalmistelut (liikuntasali)

Valmistuneet työvaiheet:

- Sääsuojan purkaminen (osapurku)
- 1.krs kevyet väliseinät (liikuntasali)

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton peltityöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs plaanovalu
- 2.krs plaanovalu

Valmistuneet työvaiheet:

- Kattoikkunoiden asennus
- 1.krs plaanovalmistelut
- 1.krs musiikkitilojen IV-asennukset
- 2.krs plaanovalmistelut

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH koneasennukset
- IVKH IV-asennukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


-

Valmistuneet työvaiheet:

- Sääsuojan purkaminen (osapurku)
- Nuorisotilan siirtoseinän teräsrungon asennus
- 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Muuta

- Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Julkisivun puu- ja levytyöt käynnissä uimahallin puoleisella seinustalla
- Työmaalämmitys purettu
- Sääsuojanpeitteet ja -runko puretaan vaiheittain

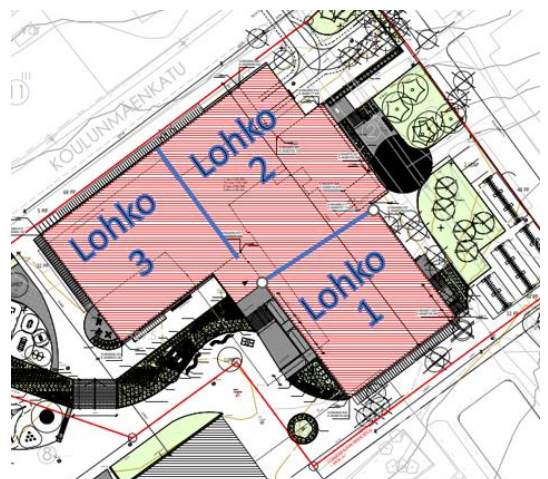

Lohko 3. 24.5.2024

Sääsuojan purut valmistuneet tällä viikolla (lohko 1 ja 3 päädyt). Työt jatkuvat vaiheittain.



Lohko 2. 24.5.2024

Kerros 1. valmistelut meneillään
lattiatasoitteelle (plaano). Valu
maanantaina.



Lohko 3. 24.5.2024

Kerros 2 tasoitus- ja maalaustyöt
pääosin tehty. IV-asennukset
seuraavat perästä.



Lohko 3. 24.5.2024

Sääsuoja purettu lohkon 3
päädyistä. Pellitystyöt käynnissä
lohkon 2 alueella.

