

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 22/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- 1.krs etuputsityöt (liikuntasali)
- 1.krs plaanovalmistelut (liikuntasali)
- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs plaanovalmistelut
- 1.krs plaanovalu (liikuntasali)

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs IV-asennukset

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton peltityöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH koneasennukset
- IVKH IV-asennukset
- 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Huoltokatoksen tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs plaanovalmistelut
- 2.krs plaanovalu (käytävältä pieni osuus)

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs plaanovalu
- 2.krs plaanovalu

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- 2.krs IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Julkisivun puu- ja levytyöt käynnissä uimahallin puoleisella seinustalla
- Sääsuojanpeitteet ja -runko puretaan vaiheittain, aloittaen lohko 1 ja lohko 3 päädyistä

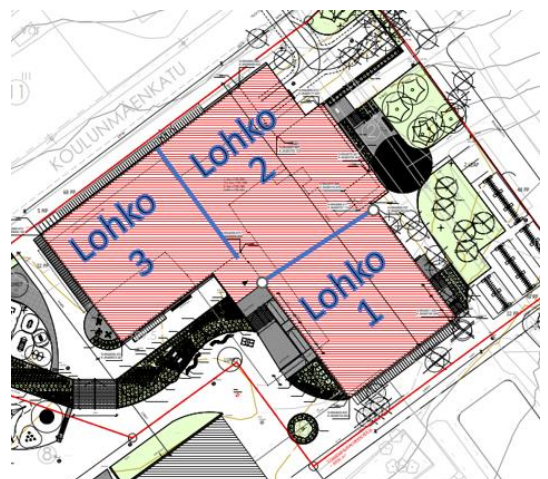

Lohko 1. 29.5.2024

Telineet purettu lohkon 1
päädyistä ja siirretty purkamaan
lohkon 3 päätä. Lohko 2
purkutytöt seuraavat perästä.




Lohko 2. 29.5.2024

Valoaukon tasoitus- ja
maalaustyöt sekä alakattotyöt
pääosin tehty. Telineet purettu.



Lohko 1. 29.5.2024

Liikuntasalin tyhjennys tavaroista
ensi viikon plaanovalulle
käynnissä.

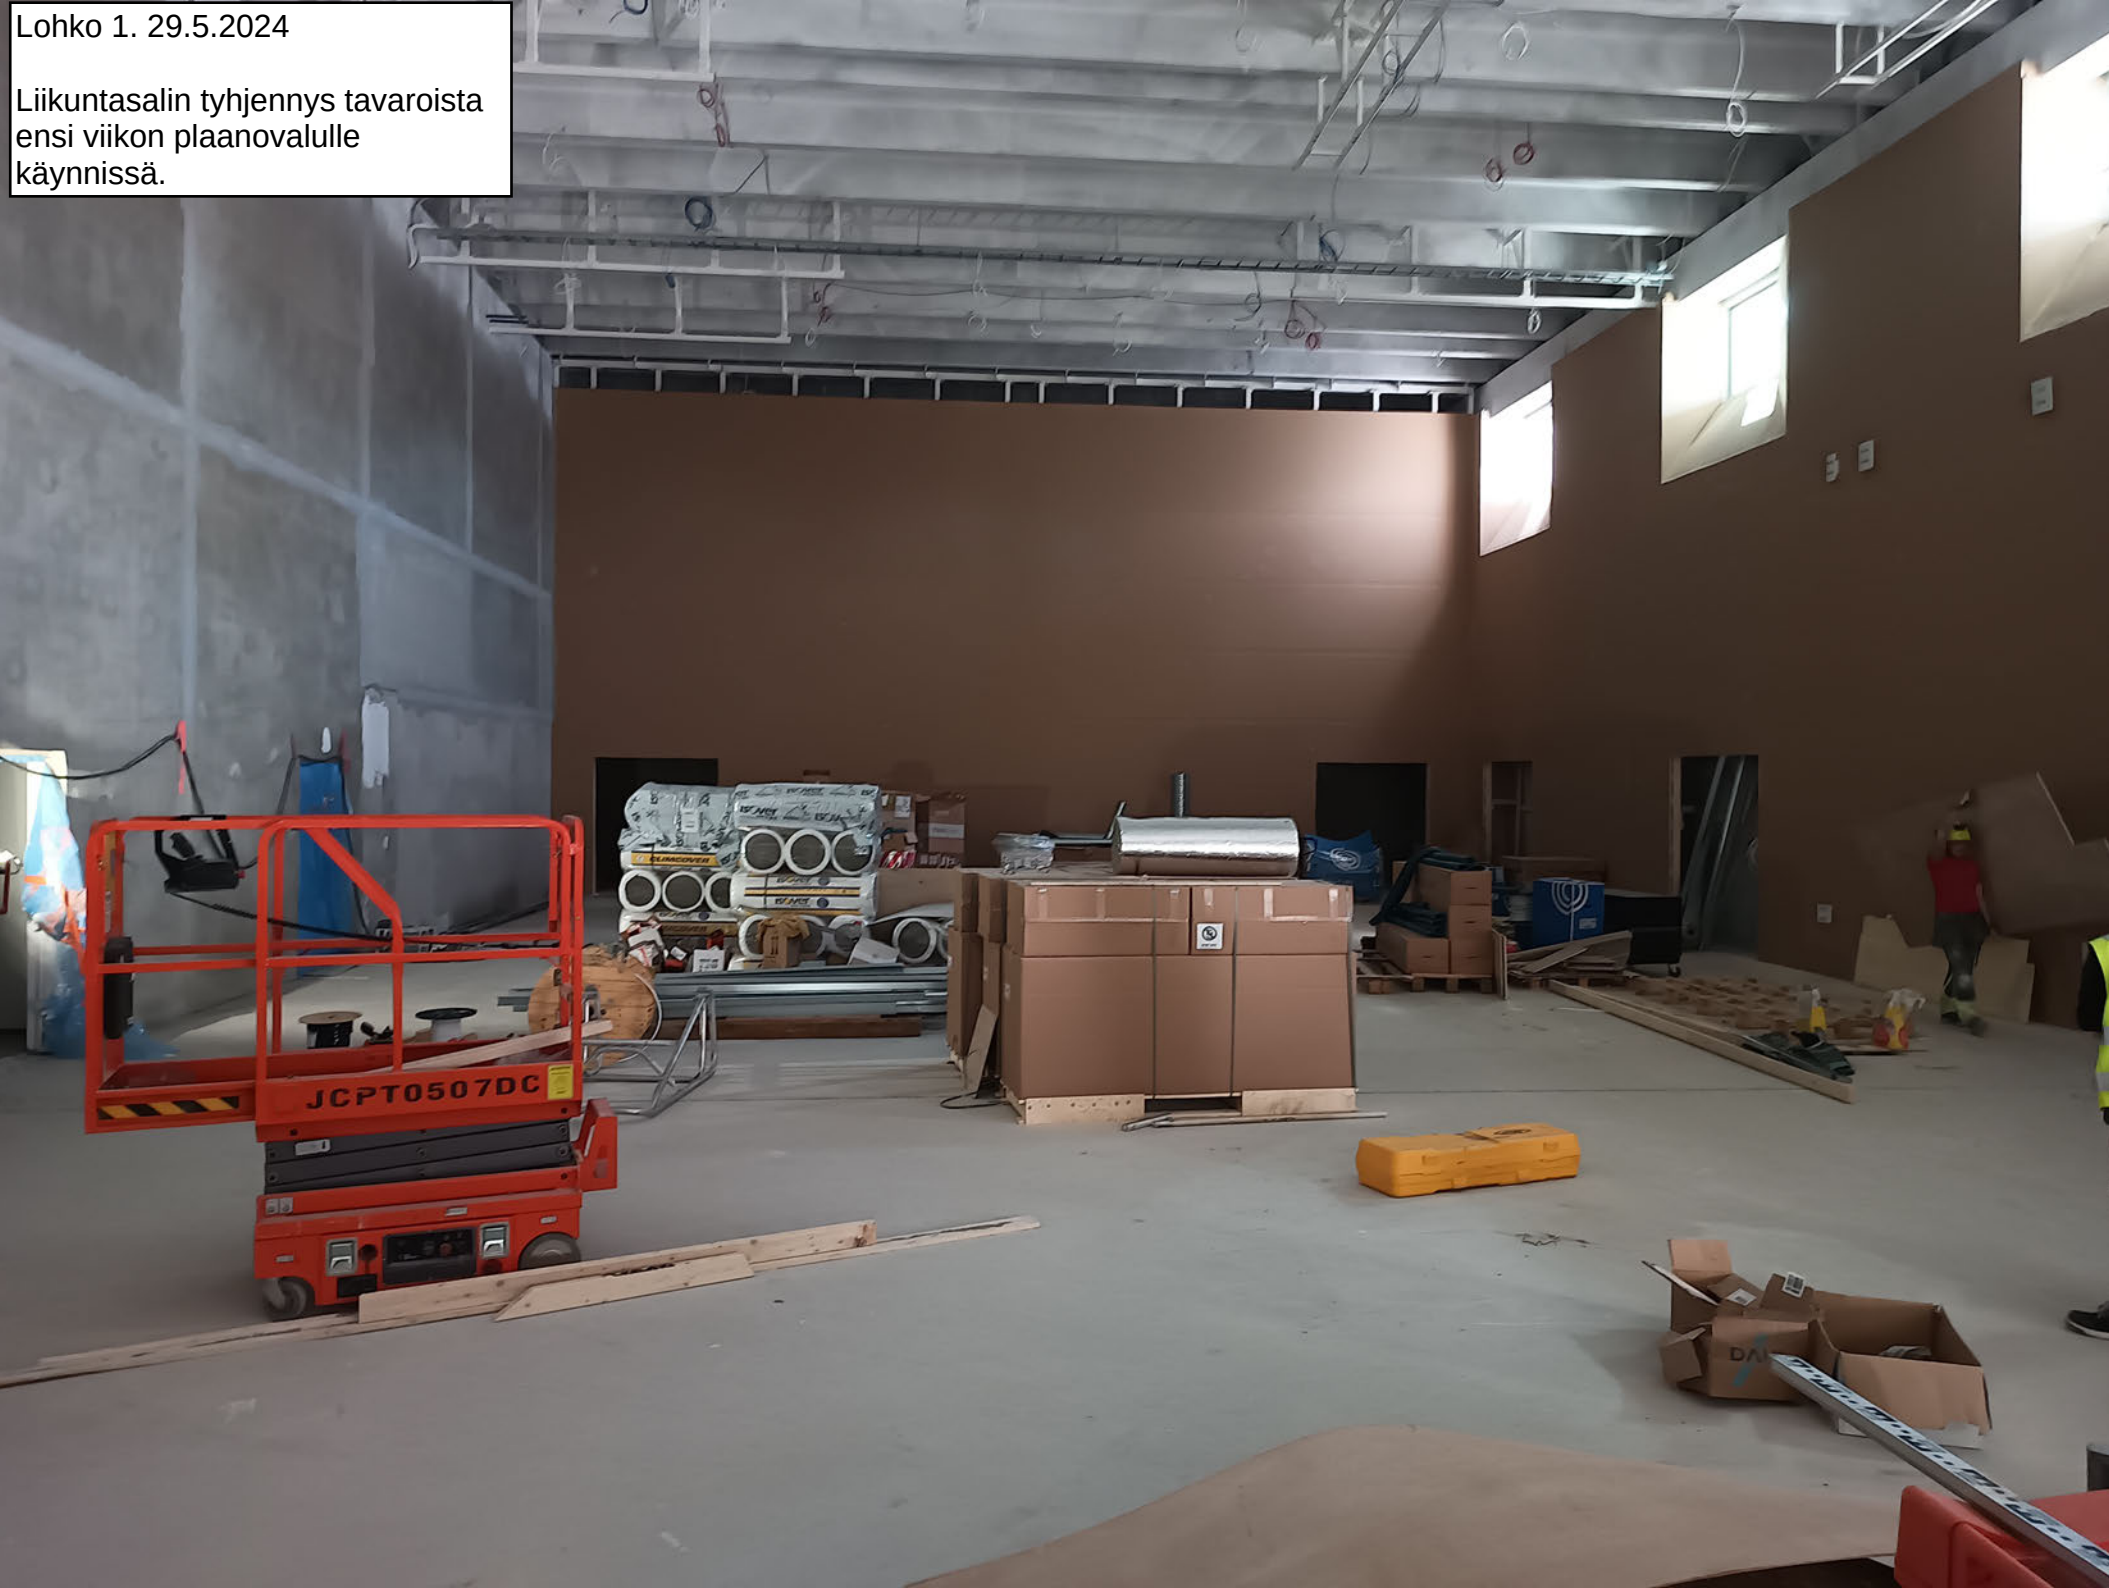

Lohko 1. 29.5.2024

Väestönsuojan tiloissa ovat
vedeneristys- ja laatoitustyöt
käynnissä.

