

14.6.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 24/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs etuputsityöt (liikuntasali)

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton peltityöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH koneasennukset
- IVKH IV-asennukset
- 2.krs tasointus- ja maalaustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Huoltokatoksen tasointus- ja maalaustyöt
- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- 2.krs IV-asennukset
- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs IV-asennukset

Valmistuneet työvaiheet:

-

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Maantäytöt rakennuksen ympärillä
- Maakaapeloinnit
- Julkisivun puu- ja levytyöt (uimahallin puoleinen seinusta)

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- Ulkokatoksien teräsrakenteiden asennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- Lohko 1 sääsuojapeitteet ja -runko
- Lohko 3 sääsuojapeitteet ja -runko

Muuta

- Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa. Tu-
lossa muutoksia kevyeen liikenteeseen
Koulumäenkadulla ja Mikonraitilla

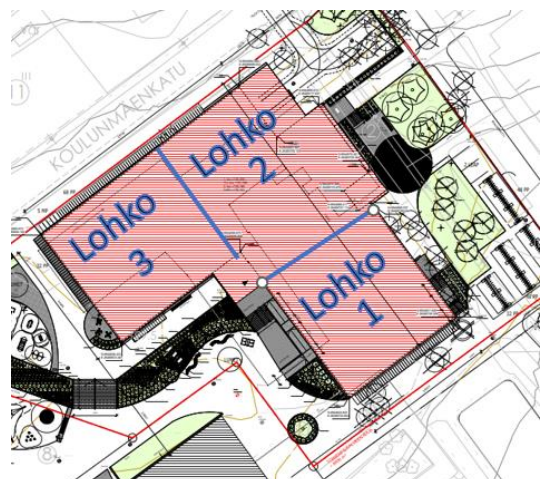

Lohko 3. 14.6.2024

Maatäytöt etenevät rakennuksen
päädyssä lohkolle 3.




Lohko 2. 14.6.2024

IV-konehuoneen asennukset
loppusuoralla. Putkiurakoitsija
seuraa perästä.



Lohko 2. 14.6.2024

Käytävät alkavat saamaan väriä pintaan.

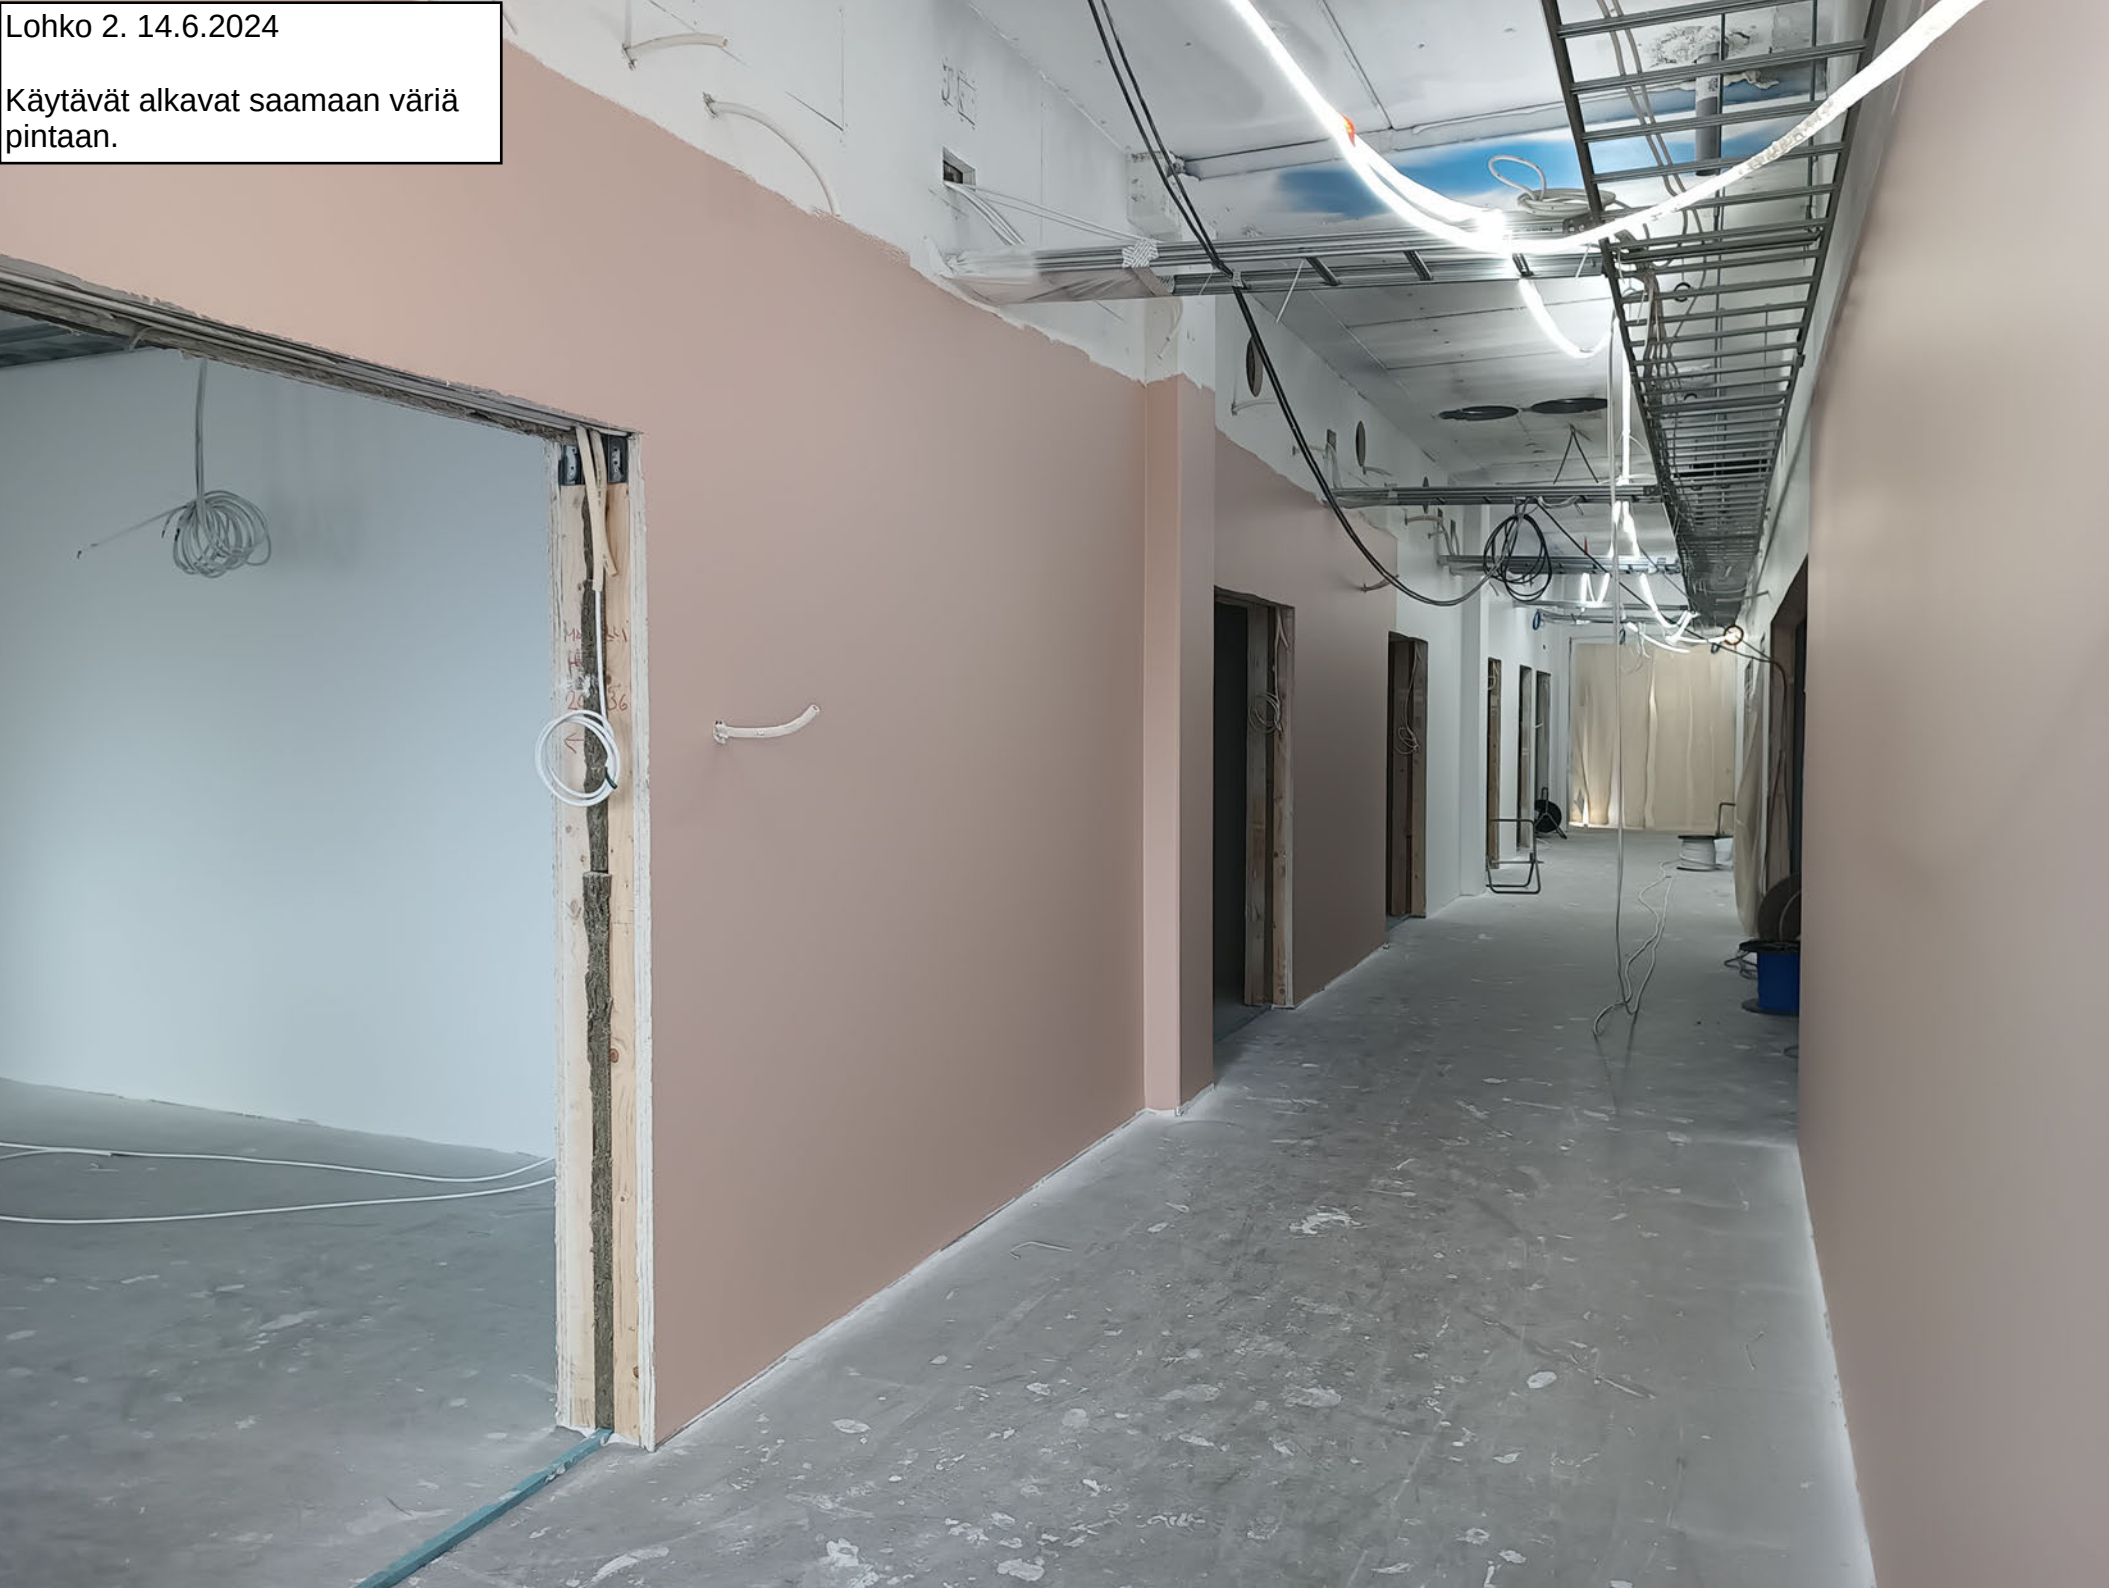

Lohko 3. 14.6.2024

Vedeneristykset työn alla lohkon 3
WC-tiloissa. Laatoitustyöt
seuraavat perästä.

