

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 26/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 2.krs alakattorungon asennus

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.krs alakattorungon asennus

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton peltityöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH koneasennukset
- IVKH IV-asennukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs sähkökeskuksien valmistelevat mattotyöt

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 1.krs IV-asennukset
- 2.krs IV-asennukset
- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Maantäytöt rakennuksen ympärillä
- Maakaapeloinnit
- Julkisivun puu- ja levytyöt (uimahallin puoleinen seinusta)
- Sääsuojatelineiden purkutyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- Lastauslaiturin etuputsityöt
- Lastauslaiturin alakattorakenteet

Valmistuneet työvaiheet:

- Sääsuojan purku lohko 2
- Ulkokatoksien teräsrakenteiden asennukset

Muuta

- Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa. Ensi kuukauden puolella tulossa muutoksia kevyeen liikenteeseen Koulumäenkadulla ja Mikonraitilla

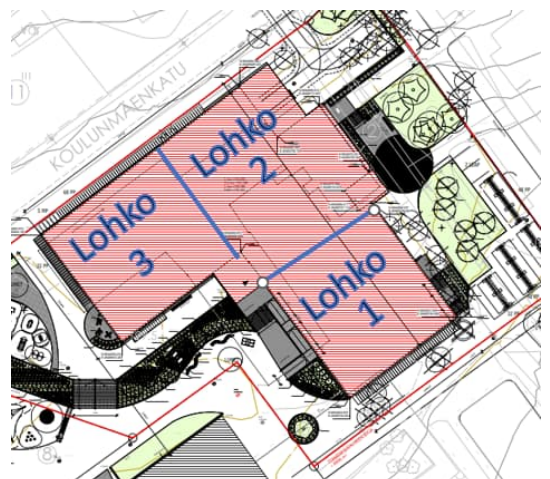

Lohko 2. 28.6.2024

Ulkokatoksien teräsrakenteiden
asennukset tehty. Puu- ja peltityöt
seuraavat perästä. Julkisivu-
paneloinnin valmiusaste 50%.



Lohko 2. 28.6.2024

1.krs musiikkitiloissa aloitettu
tasoitustyöt.



Lohko 1. 28.6.2024

Alakattorunkoja aloitettu 2.krs:ssa.
Tekniikka- ja reunalevyt
paikallaan. Pölystä puhdistus
(aikanaan) ennen ummistusta.



Lohko 3. 28.6.2024

Ulkokatoksien teräsrakenteiden
asennukset tehty. Puu- ja peltityöt
seuraavat perästä.

