

5.7.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 27/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- IV-asennukset (liikuntasali)
- 2.krs alakattotyöt

Valmistuneet työvaiheet:

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Vesikaton peltityöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH koneasennukset
- IVKH IV-asennukset
- Vesikaton puutyöt
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 1.krs mattotyöt
- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- IVKH putkityöt
- 1.krs lattianpinnoitustyöt
- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 1.krs IV-asennukset
- 2.krs IV-asennukset
- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt
- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs lattianpinnoitustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Maantäytöt rakennuksen ympärillä
- Maakaapeloinnit
- Julkisivun puu- ja levytyöt (uimahallin puoleinen seinusta)
- Sääsuojatelineiden purkutyöt
- Lastauslaiturin alakattorakenteet
- Lastauslaiturin maalaustyöt
- Pääsisääntulokatoksen teräsrakenteet

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- Pääsisääntulokatoksen puurakenteet

Valmistuneet työvaiheet:

- Lastauslaiturin etuputsityöt

Muuta

- Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa. Tämän kuukauden loppupuolella tulossa muutoksia kevyeen liikenteeseen Koulumäenkadulla ja Mikonraitilla

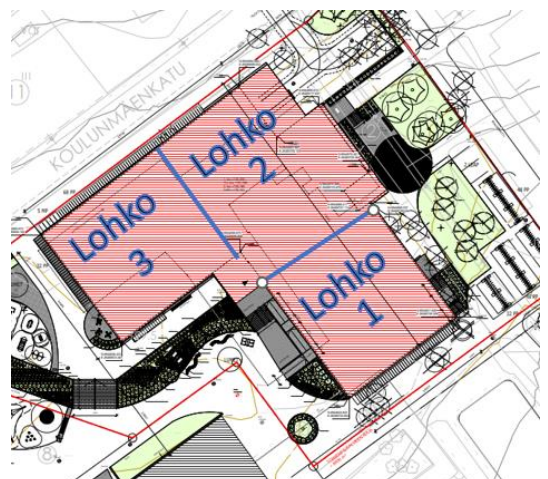

Lohko 2. 5.7.2024

Pääsisäänkäynnin ulkokatoksen
teräsrakenteiden asennukset tehty
tänään. Puu- ja peltityöt seuraavat
perästä.



Lohko 1. 5.7.2024

Liikuntasalin IV-asennustyöt
alkavat ensi viikolla. Salin
tyhjennys ja puhdistus käynnissä.



Lohko 2. 5.7.2024

Puutyötilojen mattotyöt käynnissä.
Suojaukset perään. Viereisissä
huoneissa lattian epoksityöt
alkavat ensi viikolla.



Lohko 2. 5.7.2024

Lastauslaiturin alakaton työt
käynnissä. Tällä ja seuraavalla
viikolla maalaustyöt ja
talotekniikan asennus ennen
ummistamista.

