

12.7.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 28/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- IV-asennukset (liikuntasali)

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs alakattotyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Vesikaton peltityöt
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH koneasennukset
- IVKH IV-asennukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 1.krs lattianpinnoitustyöt
- 1.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.krs mattotyöt
- 1.-2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- IVKH putkityöt

Valmistuneet työvaiheet:

- Talotekniikkareikien poraukset
- Vesikaton puutyöt

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 1.krs lattianpinnoitustyöt
- 1.krs IV-asennukset
- 2.krs IV-asennukset
- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Maantäytöt rakennuksen ympärillä
- Maakaapeloinnit
- Julkisivun puu- ja levytyöt (uimahallin puoleinen seinusta)
- Sääsuojatelineiden purkutyöt
- Lastauslaiturin alakattorakenteet
- 1.krs ikkunapellitykset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- Sisääntulokatoksien puurakenteet
- Sisääntulokatoksien peltirakenteet

Valmistuneet työvaiheet:

- Pääsisääntulokatoksen teräsrakenteet
- Lastauslaiturin maalaustyöt

Muuta

- Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa. Tämän kuukauden loppupuolella tulossa muutoksia kevyeen liikenteeseen Koulumäenkadulla ja Mikonraitilla

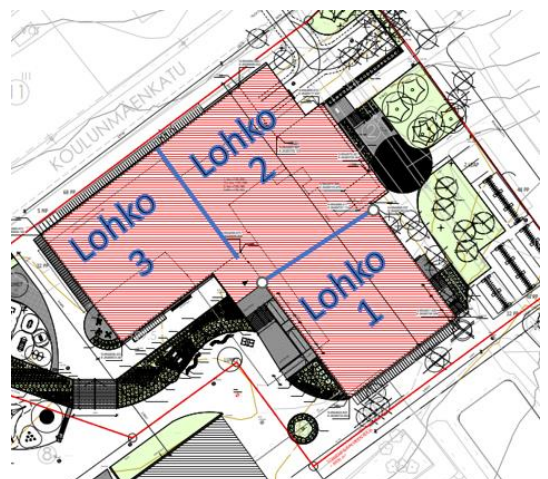

Lohko 2. 12.7.2024

Kaikki kohteen epoksinnoitteet
pääosin asennettuna tämän viikon
aikana.



Lohko 2. 12.7.2024

Kuivien tilojen laatoitustyöt edistyvät hyvää tahtia. Valmiit pinnat suojataan.



Lohko 2. 12.7.2024

Telinepurku edistyy hurjaa
vauhtia. Ikkunapellitykset jatkuvat
perästä.



Lohko 2. 12.7.2024

Lastauslaiturin maalaustyöt
valmiit. Alakaton levytystyöt
jatkuvat ensi viikolla.

