

26.7.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 30/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- IV-asennukset (liikuntasali)

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs alakattotyöt

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Vesikaton peltityöt
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH IV-asennukset
- IVKH putkityöt
- IVKH ja ullakon palokatkotyöt
- Raitisilmakammion eristystyöt
- 1.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.krs mattotyöt
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs alakattotyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs IV-asennukset
- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs IV-asennukset

Valmistuneet työvaiheet:

-

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Maantäytöt rakennuksen ympärillä
- Maakaapeloinnit
- Julkisivun puu- ja levytyöt (uimahallin puoleinen seinusta)
- Sääsuojatelineiden purkutyöt
- Sisääntulokatoksien puurakenteet
- Sisääntulokatoksien peltirakenteet
- 1.krs ikkunapellitykset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- Sisääntulokatoksien peltirakenteet
- Piha- ja aluevarustetyöt

Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankulkuväylä kulkee Koulumäenkadun lävitse. Lisäksi vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.

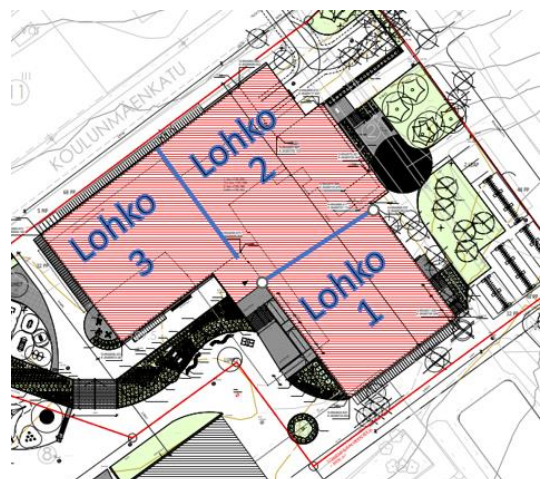

Piha. 24.7.2024

Pääsisääntulokatoksen puutyöt valmistuvat ensi viikolla. Peltityöt seuraavat perästä. Lähiaikoina lasiseinäelementin asennus.



Piha. 23.7.2024

Työmaa-alueen laajennus
uimahalliin päin. Koulumäenkatu
avattu jalankulkuväylälle.



Piha. 26.7.2024

Puupaneeliseinien rungot valmistuvat ensi viikolla alkuvuikosta. Panelointi seuraa perästä. Telineiden purku näiden perään.



Piha. 26.7.2024

Pääsisääntulokatos sivusta. Ensi viikolla alkavat piha- ja aluevarustetyöt eli tukimuurien, portaiden ja liuskojen asennukset.

