

11.10.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 41/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Salivarusteiden asennus (liikuntasali)
- Säteilijöiden asennus (liikuntasali)
- 1.krs rimaseinät
- 1.krs mattotyöt
- 1.-2.krs välioviasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- VSS-tiiveysmittaukset
- Liikuntasalin alakattotyöt (runko)

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- IVKH putkityöt
- Aulan ruiskutasoitekattotyöt
- 1.krs mattotyöt
- 1.-2.krs rimaseinät
- 1.-2.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.-2.krs IV-asennukset
- 2.krs vinyylilankkuasennukset
- 2.krs alakattotyöt (runko)

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs mattotyöt

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs IV-asennukset
- 1.krs kuivien tilojen laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.-2.krs välioviasennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.-2.krs alakattotyöt (runko)

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Piha- ja aluevarustetyöt
o Asfaltointi

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


-

Valmistuneet työvaiheet:

- Katoslippojen kourut ja syöksyt (viimeistely)

Muuta

- Umpiteräs- ja alumiinilasiovien (ulko-ovet) asennettu
- Lukitus- ja heloitustyöt käynnissä sisällä
- Varusteasennukset käynnissä
- Kaluste- ja laiteasennukset käynnissä
- Maalaustyöt tehty. Viimeinen maalauksen korjauskierros loppuvaiheessa
- Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankulkuväylä kulkee Koulumäenkadun lävitse. Lisäksi vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.

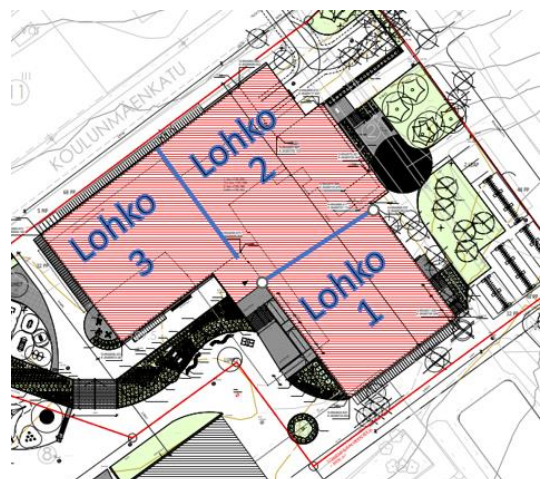

Piha. 8.10.2024

Pyöräkatoksien rungot
asennettuna. Asfaltointi
seuraa perästä.



Lohko 2. 11.10.2024

Alakatto- ja kalusteasennukset
edenneet 2.krs AKMO:n tiloissa.
Vinyylilankkuasennukset aloitettu.



Lohko 2. 11.10.2024

Vaimennusseinäelementtien
asennus käynnissä 1.krs AKMO:n
tiloissa. Lattiamateriaalin asennus
seuraa perästä.



Piha. 11.10.2024

Asfaltointi- ja pihakiveystyöt
jatkuvat rakennuksen koillis-
kaakkoispuolella.

