

1.11.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 44/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Liikuntasalin alakattotyöt (runko)
- 1.krs IV-asennukset
- 2.krs IV-päätelaiteasennukset
- 2.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs IV-päätelaiteasennukset
- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- IVKH putkityöt
- Korkean aulan maalaustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- IVKH tekniikkalevyjen asennus
- 1.krs aulan alakattotyöt (runko)

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.-2.krs rimaseinät
- 2.krs alakattotyöt (runko)

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs rimaseinät

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Piha- ja aluevarustetyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet:
 - o Lukitus- ja heloitusasennukset
 - o Varusteasennukset
 - o Kaluste- ja laiteasennukset
 - o Välioviasennukset
 - o Kenttä- ja keskuslaiteasennukset
- Koko rakennuksen alkavat työvaiheet:
 - o Vko 45: Toimintakoesiivoukset alkaen, lohkolta 1, kerroksesta 2
 - o Vko 45: Lattateräskaide- ja käsijohdeasennukset (ulkokierto)
- Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankulkuväylä kulkee Koulumäenkadun lävitse. Lisäksi vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.

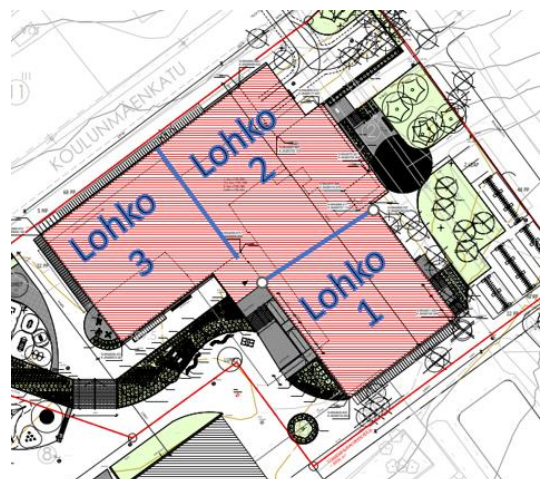

Lohko 2. 31.10.2024

Korkean aulan valaisimien
asennus käynnissä. Maalaustyöt
suoritettu loppuun. Telineiden
purku ensi viikolla.



Piha. 31.10.2024

Pihakiveyksen viimeistelyt
tehty. Aitojen pystytystyöt
käynnissä.



Lohko 2. 31.10.2024

Oviasennukset jatkuvat 2.
kerroksessa.



Lohko 1. 31.10.2024

Liikuntasalin alakattorungon
asennukset käynnissä.
Väliverho- ja laiteasennukset
loppusuoralla.

