

26.1.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

## Viikkotiedote vko 4/2024




-Sääsuoja asennettu lohkolle 1. Sääsuoja-asennukset jatkuvat lohkolta 2.



-Liikuntasalin raudoitukset. Ensimmäinen puoli valettu vk 4 torstaina ja toisen puolen valu vk 5 tiistaina.



-Vesikaton höyrynsulkuasennukset. Puurakenteet seuraavat heti perästä.

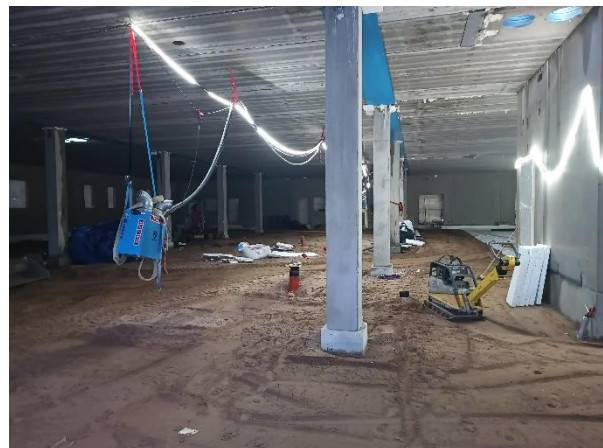

-Maatäytöt ja viemäriinjojen asennustyöt lohkolta 3. Alapohjan raudoitustyöt seuraavat perästä.

## Tapahumat viikolla 4/2024

### Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- 2.krs lattiakaivojen ja viemärivarausten asennukset
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton höyrynsulku
- Sähkötyöt
- 1.krs sementtiliimojen poistot

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs väliseinäasennukset
- 1.krs valu liikuntasali (2/2)

Valmistuneet työvaiheet:

- Sisäpuolen maataytöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- Liikuntasalin radonkermieristys
- 1.krs valu liikuntasali (1/2)
- 1.krs lattiaraudoitukset (liikuntasali)
- Sääsuoja-asennukset
- Vesikaton tukirautojen palosuojaus

### Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs väliseinäasennukset
- 1.krs sementtiliimojen poistot
- 2.krs pintalautojen raudoitukset
- 2.krs lattiakaivojen ja viemärivarausten asennukset
- 3.krs seinäelementit
- 3.krs teräsrunkoasennus
- Sääsuojan asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs vesikaton kuorien asennus

Valmistuneet työvaiheet:

- 3.krs (katto) holvivalu
- 3.krs (katto) holviraudoitukset

### Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maataytöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- 1.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden asennus
- 2.krs (katto) ontelolautojen asennus
- 2.krs (katto) onteloiden raudoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden asennus
- 2.krs lämmöneristäminen
- 2.krs vesikaton kuorien asennus
- 2.krs (katto) holvivalu

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs maan sulatus
- 2.krs seinäelementtien asennus

### Muuta

- Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Pakkanen viivästännyt osan työvaiheista viikolla

