

Äänekosken museon 2. sisävalmistusvaihe

Viikkotiedote

Viikko 12

20.3.2026

Työmaalla käynnissä sähkö-, turva-, LVI- ja jäähdytysasennukset ja lisäksi muut pienemmät rakennustyöt, kuten maalaustyöt, kalusteasennukset, läpivientien tiivistykset ja alakattojen ummistukset. Seuraavalla viikolla on tarkoitus rakentaa katolle huoltoluukku ja aloittaa laualattioiden maalaus.




Porrashuoneen kolmannen kerroksen tasanteen kaiteeseen on tehty jatkokappale. Vanha kaide ei täytä nykymääräyksiä korkeuden puolesta. Kuvassa kaide maalaamossa kuivamassa.



Kolmannen kerroksen henkilökunnan tiloihin on asennettu keittiökalusteita.



Vanhoja ikkunapuitteita on maalattu.

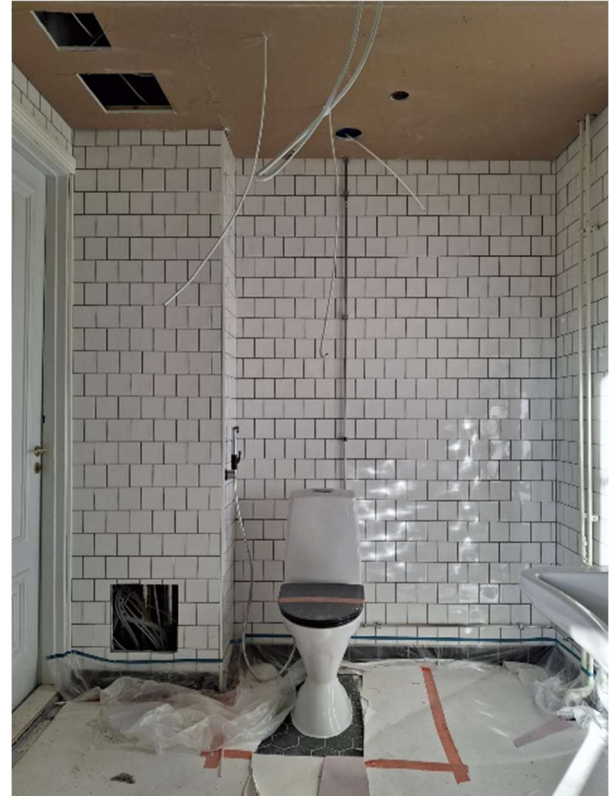

Viimeisiä alakattoja on asennettu esimerkiksi WC-tiloihin yläpuolisten tekniikkatöiden valmistuessa.



Viimeiset lattialaatoitukset on asennettu ja suojattu. Seuraavana työvaiheena jalkalistojen asennusta. Uudet jalkalistat ovat vanhanmallisia korkeita jalkalistoja.



Hätäpoistumistieporras on asennettu paikalleen. Porrasta pitkin pääsee poistumaan toisesta kerroksesta hätätilanteissa.



Sähköasennukset jatkuvat työmaalla.
