

Äänekosken museon 2. sisävalmistusvaihe

Viikkotiedote

Viikko 13

27.3.2026

Työmaalla käynnissä sähkö-, turva-, LVI- ja jäähdytysasennukset ja lisäksi muut pienemmät rakennustyöt, kuten maalaustyöt. Seuraavalla viikolla on tarkoitus tehdä lista-asennuksia ja jatkaa lattiamaalauksia.




Näyttelytilassa jätetään näkyviin kaista rakennuksen vanhaa tiilimuurausta. Muuraus peitetään läpinäkyvällä pleksillä. Sitä ennen muuraukseen asennetaan pölynsidontakäsittely, ettei vanha muurauslaasti karise.



Kalustehyllyjä asennettuna siivoustilassa.



Vesikatolle asennetaan jäähdytyksen ulkoyksiköt. Yksiköt tulevat kulkusillan vierustalle. Kattotyöskentely tehdään turvavaljastyönä.

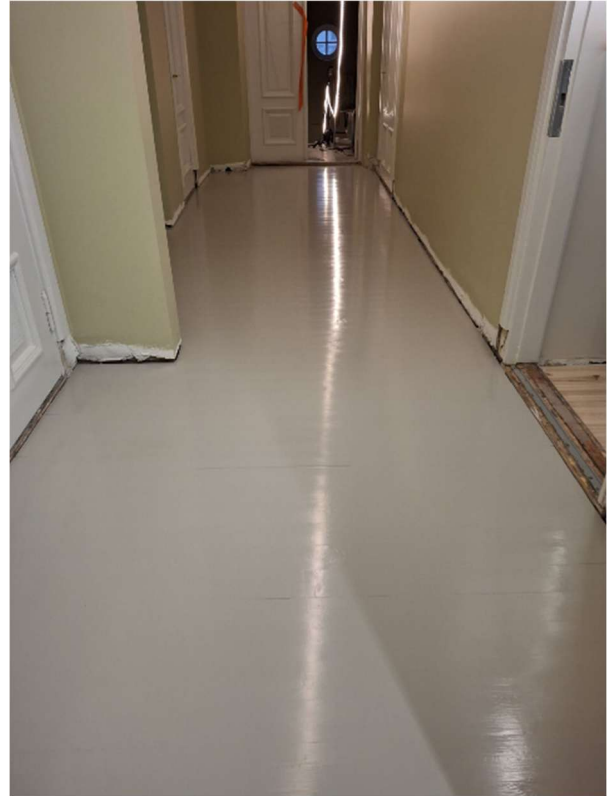

Lautalattioita maalattuna, kuvassa käytävä. Seuraavaksi jalkalistojen asennusta. Tiloihin tulee vanhanaikaiset korkeat jalkalistat.



Näyttelytilan lattiamaalaus käynnissä.
