

Äänekosken museon 2. sisävalmistusvaihe

Viikkotiedote


Viikko 7

13.2.2026

Työmaalla käynnissä aulatilojen lattiaalaatitustyöt, lautalattia-asennusten viimeistelyt, sähköjohtoreittien rakentaminen, valaisinkiskojen asentaminen ja hissien seudun viimeistely.




Hissin teräsrakenteiden kotelointi ja siistiminen käynnissä 2. kerroksessa. Teräsrakenteet koteloidaan piiloon ja yhdistetään vanhan tilan muihin seinäpintoihin.

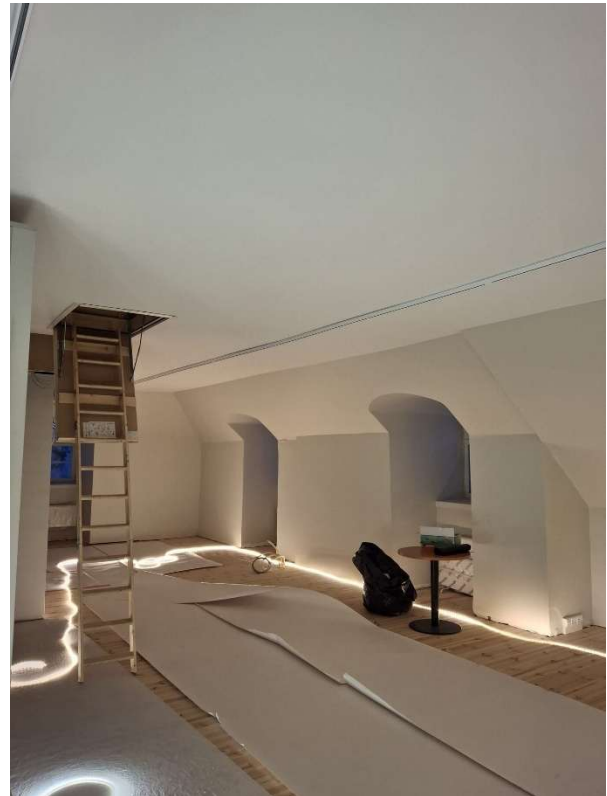

Valaisinkiskojen asennus käynnissä 3. kerroksen näyttelytiloissa.



Hissin teräsrakenteiden kipsilevykoteloinnin pintakäsittelyt käynnissä 1. kerroksen sisäänkäyntiaulassa. Vanhantyylinen kattofriisi tulee kiertämään hissin kotelorakenteet ja vanhanmallinen jalkalista tukipilarien koteloinnit.

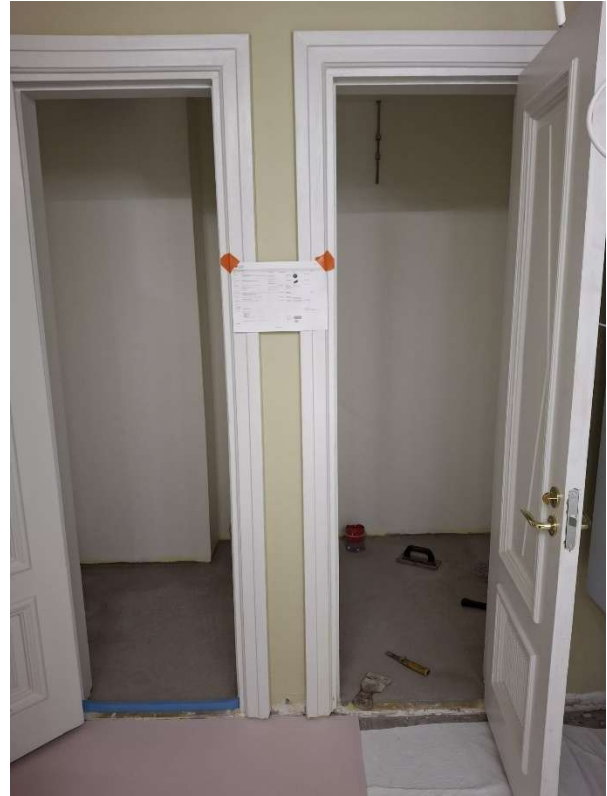

WC- ja siivoustilojen lattialaatoitusten valmistelut käynnissä. Lattiat ovat tasoitettu ja seuraavana työvaiheena vedeneristykset ja laatoitukset. Laatoitustöiden jälkeen tiloja päästään varustamaan ja kalustamaan.



Vanhojen ikkunoiden sisäpuitteiden pintakäsittely käynnissä. Ikkunapuitteet hiotaan kevyesti, maalataan ja ikkunakilvet vaihdetaan messinkisiksi.
